

EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessores	21 Janeiro 23/01	13/02	11 Março 06/03	27/03	01
1	ETE IPIRANGA	1 dia	Seg 31/10/22	Seg 31/10/22						
2	SIS SURUBI - Coletoras e Linhas de Recalque e Elevatória	241 dias	Sex 01/09/23	Sex 02/08/24						
2.1	Centro	56 dias	Sex 01/09/23	Sex 17/11/23						
2.1.1	Rede Coletora 200 (140m)	10 dias	Seg 06/11/23	Sex 17/11/23						
2.1.2	Rede Coletora 250 (337m)	14 dias	Sex 01/09/23	Qua 20/09/23						
2.2	Centro	5 dias	Seg 13/11/23	Sex 17/11/23						
2.2.1	Rede Coleora 150 (110m)	5 dias	Seg 13/11/23	Sex 17/11/23						
2.3	Centro	5 dias	Sex 01/09/23	Qui 07/09/23						
2.3.1	Rede coletora 150 (113m)	5 dias	Sex 01/09/23	Qui 07/09/23						
2.3.2	Recalque 75 (113m)	4 dias	Sex 01/09/23	Qua 06/09/23						
2.4	Comercial	14 dias	Sex 01/09/23	Qua 20/09/23						
2.4.1	Rede Coletora 250 (424m)	14 dias	Sex 01/09/23	Qua 20/09/23						
2.5	Surubi	205 dias	Sex 01/09/23	Qui 13/06/24						
2.5.1	Rede Coletora 250- 200 e 150mm (750m)	205 dias	Sex 01/09/23	Qui 13/06/24						
2.6	Surubi	97 dias	Qui 15/02/24	Sex 28/06/24						
2.6.1	Recalque 75 (125m)	97 dias	Qui 15/02/24	Sex 28/06/24						
2.6.2	Rede Coletora 150 (226m)	97 dias	Qui 15/02/24	Sex 28/06/24						
2.7	Surubi	20 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/09/23						
2.7.1	Recalque 75 (402m)	20 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/09/23						
2.7.2	Rede Coletora 150 (317m)	20 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/09/23						
2.8	Surubi	9 dias	Ter 11/06/24	Sex 21/06/24						
2.8.1	Rede Coletora 150 (214m)	9 dias	Ter 11/06/24	Sex 21/06/24						
2.9	Surubi	6 dias	Sex 01/09/23	Sex 08/09/23						
2.9.1	Recalque 75 (187m)	6 dias	Sex 01/09/23	Sex 08/09/23						
2.10	Surubi	9 dias	Ter 21/05/24	Sex 31/05/24						
2.10.1	Recalque 75 (262m)	9 dias	Ter 21/05/24	Sex 31/05/24						
2.11	Surubi	3 dias	Sex 26/07/24	Ter 30/07/24						
2.11.1	Recalque 75 (61m)	2 dias	Seg 29/07/24	Ter 30/07/24						
2.11.2	Rede Coletora 150 (55m)	3 dias	Sex 26/07/24	Ter 30/07/24						
2.12	Surubi	5 dias	Seg 22/07/24	Sex 26/07/24						
2.12.1	Rede Coletora 150 (78m)	5 dias	Seg 22/07/24	Sex 26/07/24						
2.13	Surubi	10 dias	Ter 09/07/24	Seg 22/07/24						
2.13.1	Rede Coletora 150 (134m)	10 dias	Ter 09/07/24	Seg 22/07/24						
2.14	Surubi	4 dias	Seg 03/06/24	Qui 06/06/24						
2.14.1	Recalque 75 (56m)	4 dias	Seg 03/06/24	Qui 06/06/24						
2.15	Centro	7 dias	Qui 29/02/24	Sex 08/03/24						
2.15.1	Recalque 75 (115m)	7 dias	Ter 30/04/24	Qua 08/05/24						
2.16	Vincentina	20 dias	Seg 05/02/24	Sex 01/03/24						
2.16.1	Recalque 75(80m)	20 dias	Seg 05/02/24	Sex 01/03/24						
2.16.2	Coletora 150 (103m)	20 dias	Seg 05/02/24	Sex 01/03/24						
2.17	Estr. Resende Rialto	7 dias	Sex 01/09/23	Seg 11/09/23						
2.17.1	Recalque 75 (220m)	7 dias	Sex 01/09/23	Seg 11/09/23						
2.18	Vincentina	6 dias	Sex 05/04/24	Sex 12/04/24						
2.18.1	Recalque 75 (80m)	30 dias	Seg 15/04/24	Sex 24/05/24						
2.18.1.1	Centro	30 dias	Seg 15/04/24	Sex 24/05/24						
2.18.1.1.1	Recalque 75 (156m)	10 dias	Seg 15/04/24	Sex 26/04/24						
2.18.1.1.2	Coletora 150(360M)	30 dias	Seg 15/04/24	Sex 24/05/24						
2.19	Vila Moderna	10 dias	Seg 27/05/24	Sex 07/06/24						
2.19.1	Recalque 75(102m)	10 dias	Seg 27/05/24	Sex 07/06/24						
2.20	Vila Moderna	5 dias	Seg 08/07/24	Sex 12/07/24						
2.20.1	Recalque 75(40m)	5 dias	Seg 08/07/24	Sex 12/07/24						
2.21	Elevatórias	150 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/03/24						
2.21.1	EEE01 (Centro)	85 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/12/23						
2.21.2	EEE02 (Centro)	85 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/12/23						
2.21.3	EEE03 (Surubi)	150 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/03/24						
2.21.4	EEE05 (Surubi)	85 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/12/23						
2.22	EEE06 (Surubi)	164 dias	Qua 01/11/23	Seg 17/06/24						
2.22.1	Civil	90 dias	Ter 09/01/24	Seg 13/05/24						
2.22.2	Liberação de Abrigo PMR	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.22.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						

Projeto: CRONOGRAMA REDES
Data: Ter 28/05/24

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessores	21 Janeiro 23/01	13/02	11 Março 06/03	27/03	01 17/04
2.23	EEE07(Surubi)	164 dias	Qua 01/11/23	Seg 17/06/24						
2.23.1	CIVIL	90 dias	Ter 16/01/24	Seg 20/05/24						
2.23.2	Liberação de Abrigo PMR	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.23.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.24	EEE08 (Surubi)	164 dias	Qua 01/11/23	Seg 17/06/24						
2.24.1	CIVIL	70 dias	Seg 29/01/24	Sex 03/05/24						
2.24.2	Liberação de Abrigo PMR	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.24.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.25	EEE09(Surubi)	164 dias	Qua 01/11/23	Seg 17/06/24						
2.25.1	CIVIL	70 dias	Seg 05/02/24	Sex 10/05/24						
2.25.2	Liberação de Abrigo PMR	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.25.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.26	EEE10 (Surubi)	164 dias	Qua 01/11/23	Seg 17/06/24						
2.26.1	CIVIL	70 dias	Seg 12/02/24	Sex 17/05/24						
2.26.2	Liberação de Abrigo PMR	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.26.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.27	EEE11 (Campos Elíseos)	85 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/12/23						
2.28	EEE 13 (Comercial)	85 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/12/23						
2.29	EEE15 (Jardim tropical)	85 dias	Sex 01/09/23	Qui 28/12/23						
2.30	EEE16 (Vicentina)	168 dias	Qua 01/11/23	Sex 21/06/24						
2.30.1	CIVIL	70 dias	Seg 18/03/24	Sex 21/06/24						
2.30.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.30.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.31	EEE17 (Vincentina)	173 dias	Qua 01/11/23	Sex 28/06/24						
2.31.1	CIVIL	70 dias	Seg 25/03/24	Sex 28/06/24						
2.31.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.31.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.32	EEE18 (Vicentina)	178 dias	Qua 01/11/23	Sex 05/07/24						
2.32.1	CIVIL	70 dias	Seg 01/04/24	Sex 05/07/24						
2.32.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.32.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.33	EEE19 (Vila Moderna)	210 dias	Seg 25/09/23	Sex 12/07/24						
2.33.1	CIVIL	70 dias	Seg 08/04/24	Sex 12/07/24						
2.33.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.33.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.33.4	EEE20 (Centro)	191 dias	Seg 25/09/23	Seg 17/06/24						
2.33.4.1	CIVIL	70 dias	Seg 25/09/23	Sex 29/12/23						
2.33.4.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias?	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.33.4.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.34	EEE21 (Centro)	188 dias	Qua 01/11/23	Sex 19/07/24						
2.34.1	CIVIL	70 dias	Seg 15/04/24	Sex 19/07/24						
2.34.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.34.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.35	EEE23 (Vila Moderna)	193 dias	Qua 01/11/23	Sex 26/07/24						
2.35.1	CIVIL	70 dias	Seg 22/04/24	Sex 26/07/24						
2.35.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.35.3	Energia ENEEL	120 dias	Ter 02/01/24	Seg 17/06/24						
2.36	EEE24 (Centro)	198 dias	Qua 01/11/23	Sex 02/08/24						
2.36.1	Civil	70 dias	Seg 29/04/24	Sex 02/08/24						
2.36.2	Emissão de Alvará de Abrigo	44 dias	Qua 01/11/23	Seg 01/01/24						
2.36.3	Energia ENEEL	120 dias	Qua 01/11/23	Ter 16/04/24						
2.36.4	Vermelho= em atraso	1 dia	Sex 02/08/24	Sex 02/08/24						
2.36.5	Azul = concluído	1 dia	Sex 02/08/24	Sex 02/08/24						

Projeto: CRONOGRAMA REDES
Data: Ter 28/05/24

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

◆

◇

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento


Progresso manual

Página 2



Projeto: CRONOGRAMA REDES
Data: Ter 28/05/24

Tarefa



Resumo Inativo



Tarefas externas



Divisão



Tarefa Manual



Marco externo



Marco



Somente duração



Data limite



Resumo



Acúmulo de Resumo Manual



Andamento



Resumo do projeto



Resumo Manual



Progresso manual



Tarefa Inativa



Somente início





Marco Inativo



Somente término





Projeto: CRONOGRAMA REDES
Data: Ter 28/05/24

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término


Tarefas externas

Marco externo

Data limite


Andamento

Progresso manual

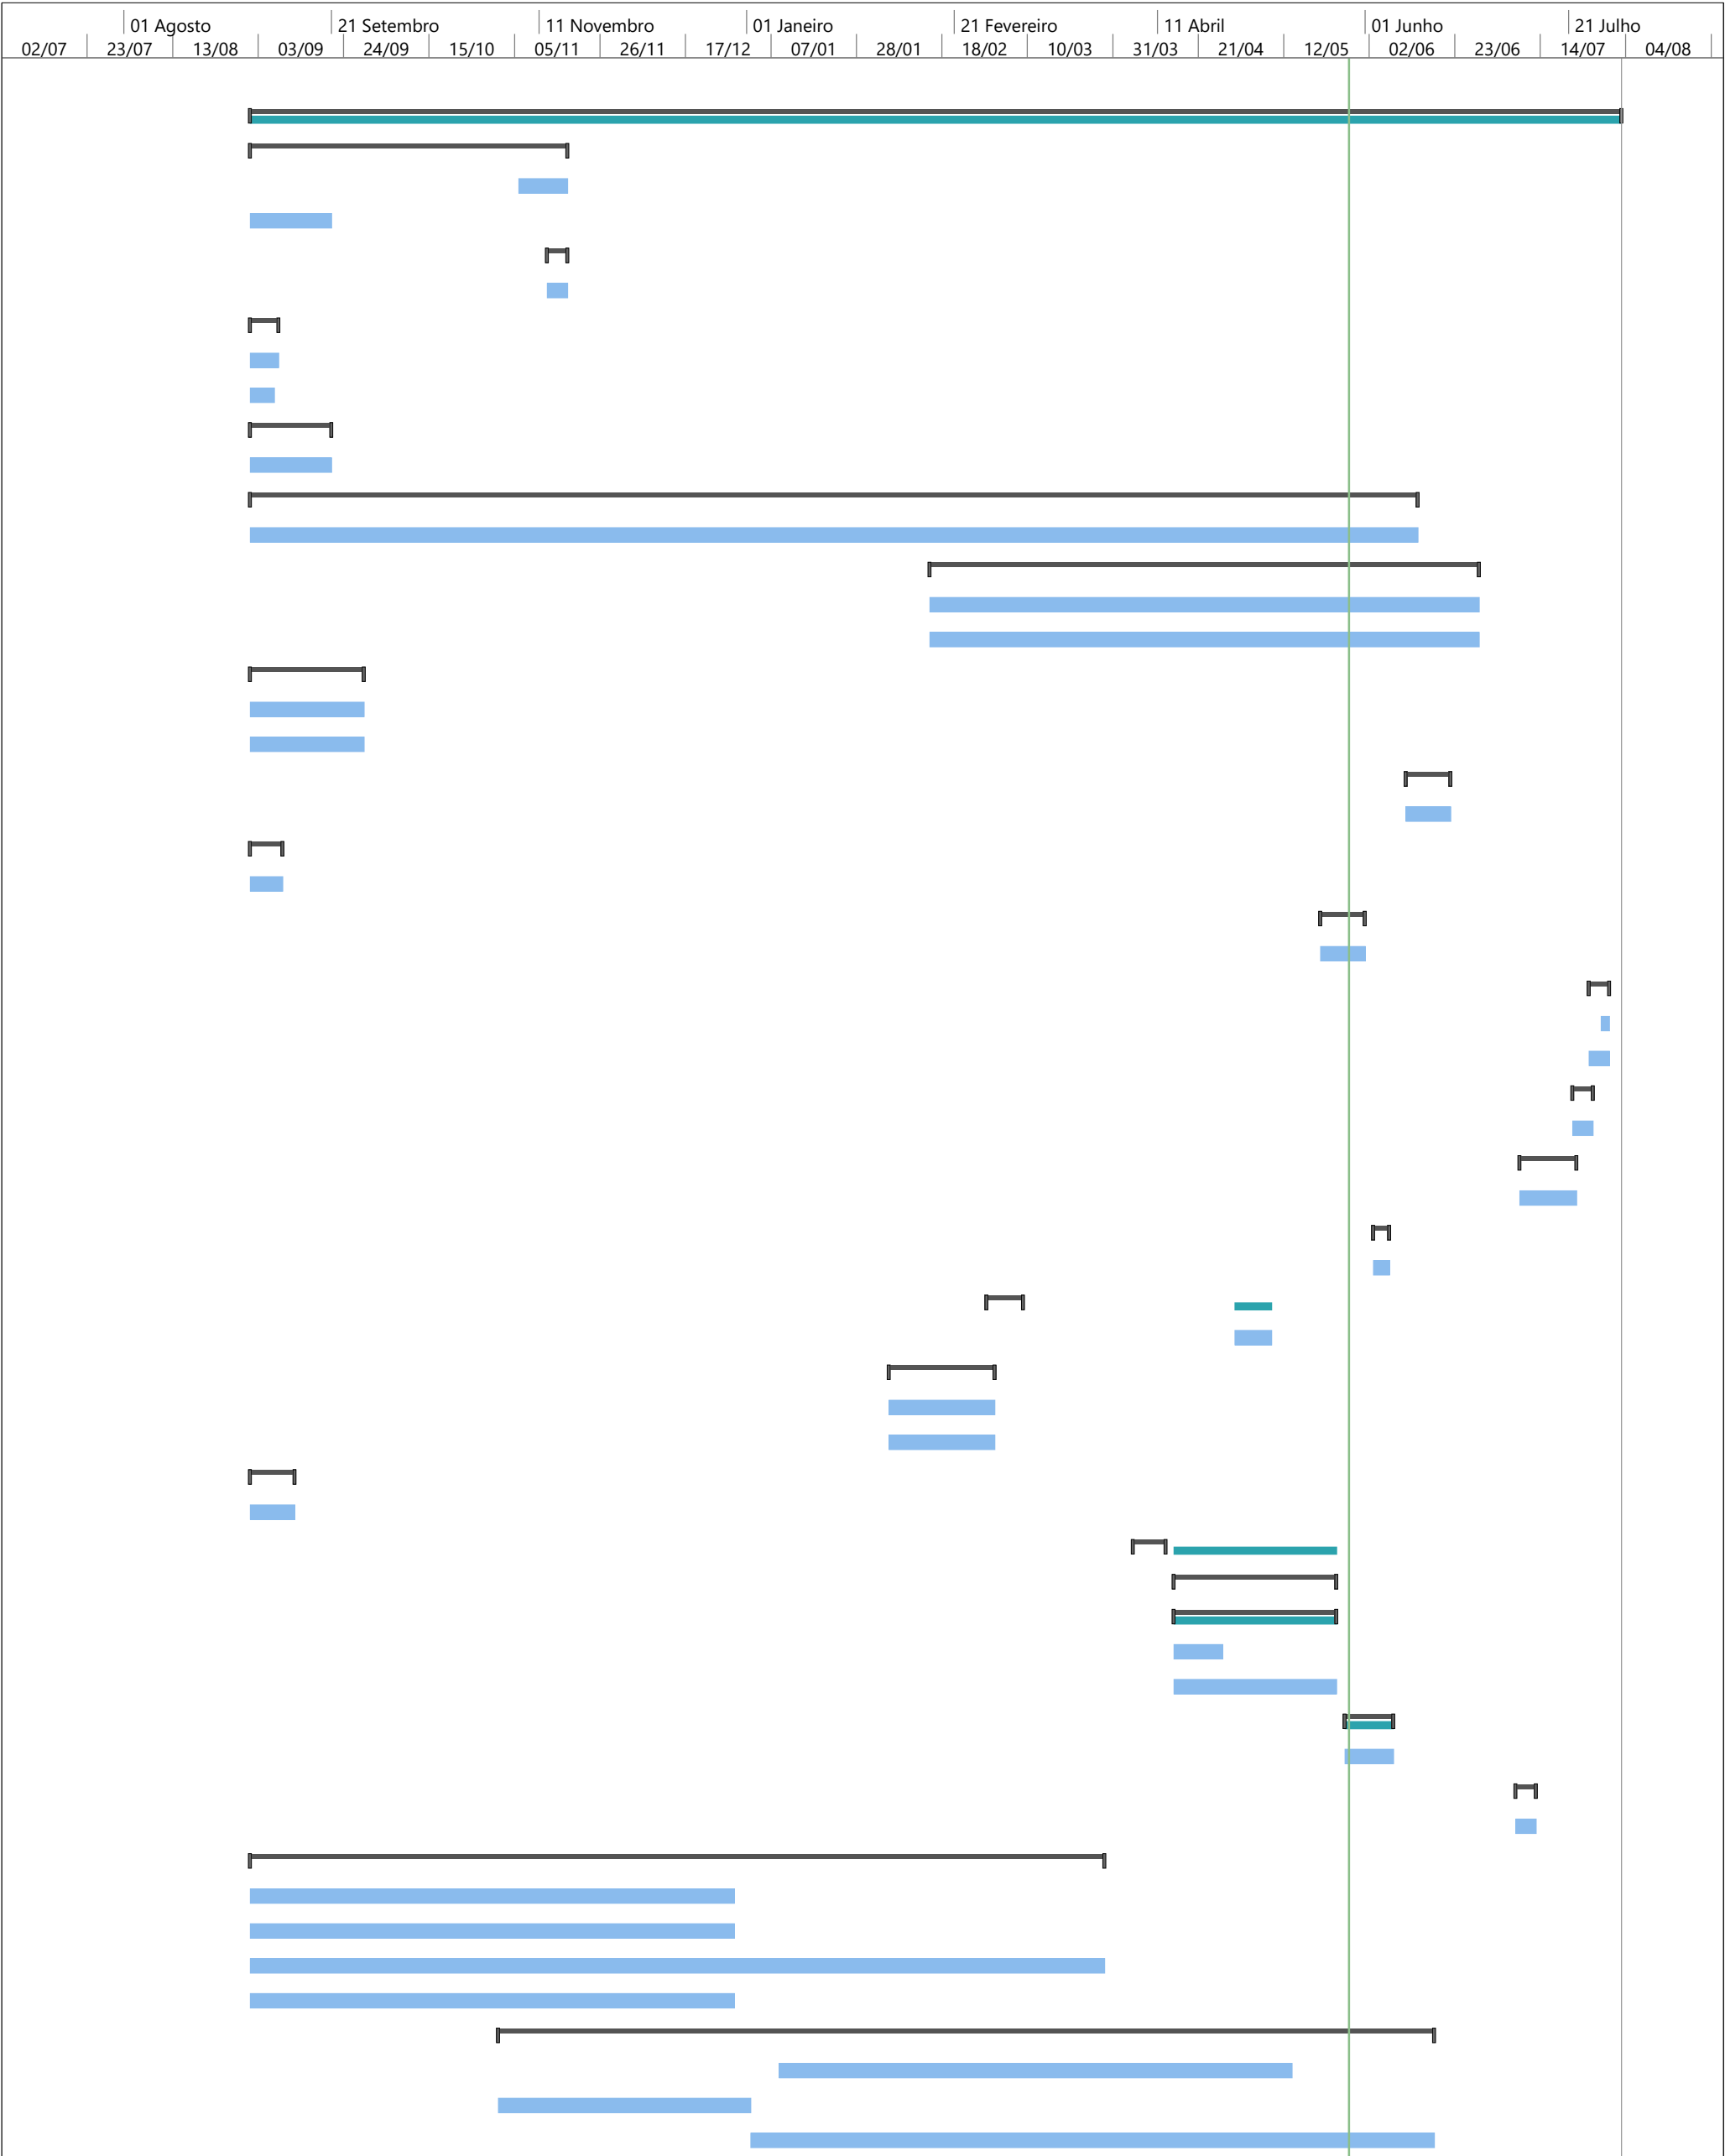

Projeto: CRONOGRAMA REDES
Data: Ter 28/05/24

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

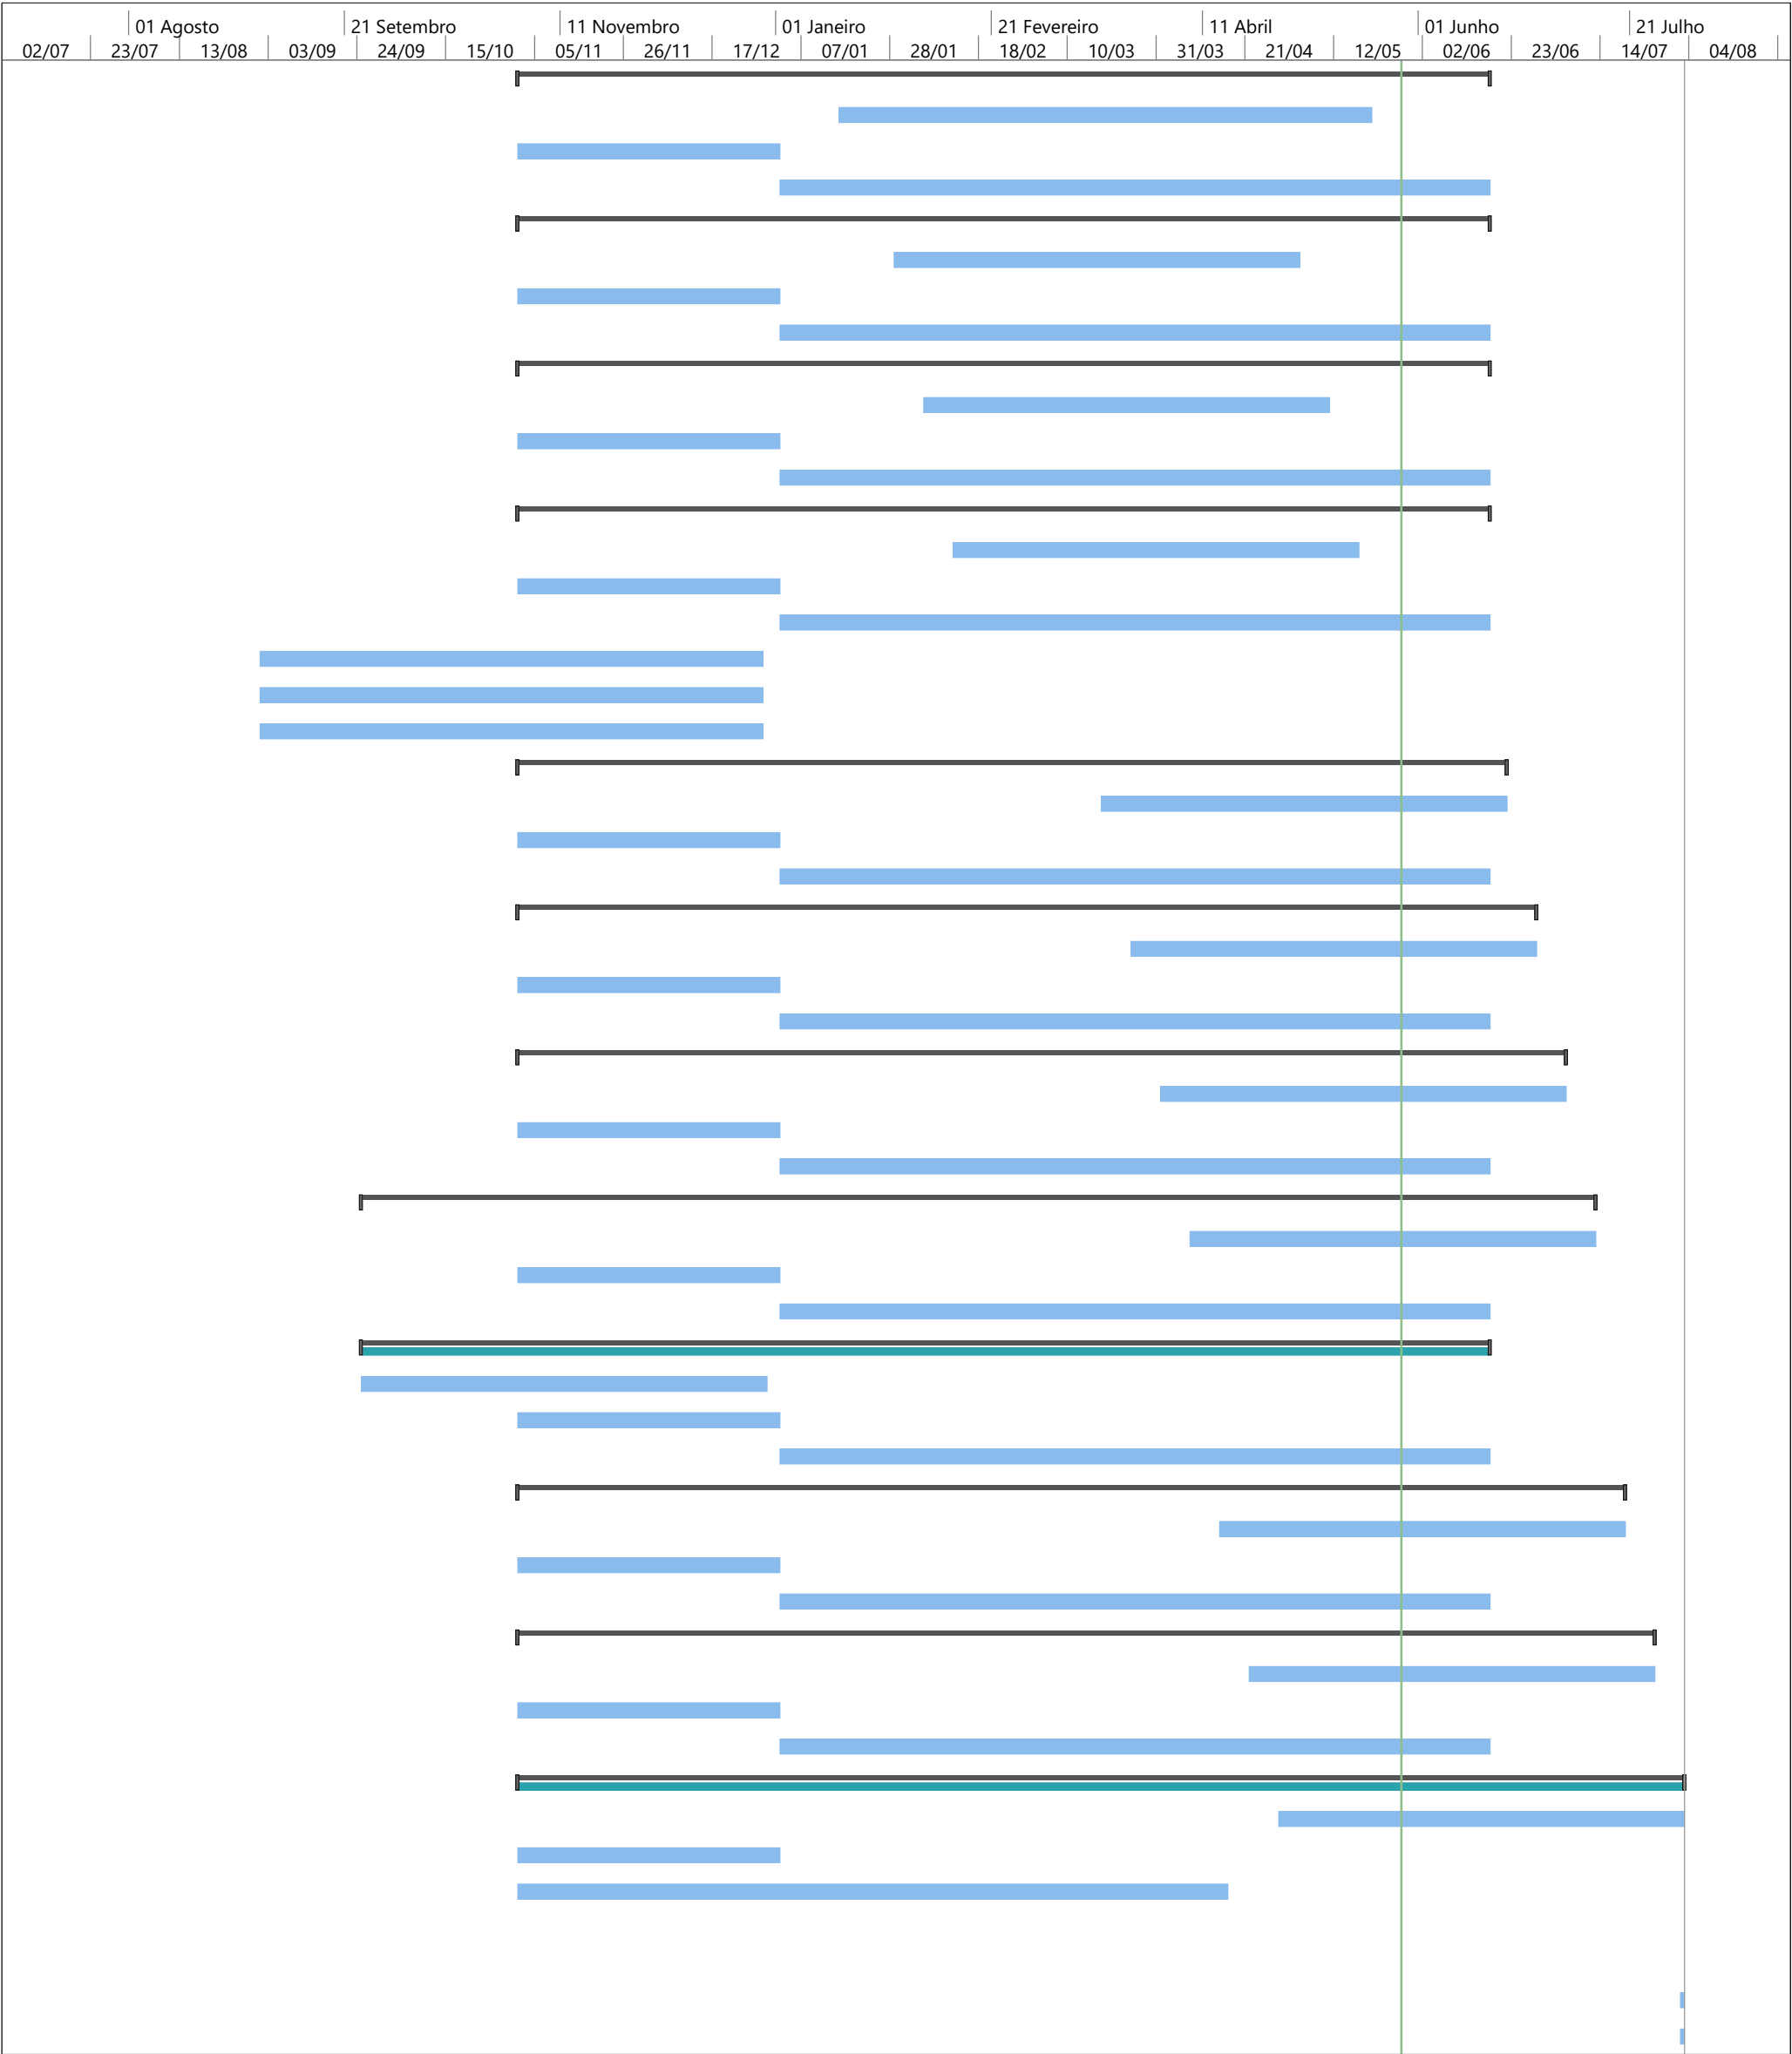

Projeto: CRONOGRAMA REDES
Data: Ter 28/05/24

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
